

平成30年8月1日
立山町総務課

弥陀ヶ原火山噴石対策に係る民間施設の整備について

1 趣 旨

弥陀ヶ原火山噴火時に緊急的な避難場所となる民間の山小屋の噴石対策について、今年度から『消防防災施設整備費補助金』（消防庁）の補助対象とされたことから、立山町としても立山山荘協同組合と連携し、山小屋の噴石対策などに取り組むもの

2 事業概要

- (1) 事業名：活動火山対策避難施設整備事業
- (2) 事業主体：立山町
- (3) 総事業費：22,896千円(うち補助対象経費 22,896千円) [当初総事業費:65,000千円]
- (4) 町補助金：20,606千円(補助対象経費の90%) [当初町補助金:36,000千円]
[うち国補助金：町負担額の1/3]
※町負担額の80%について特別交付税措置あり

補助対象経費 22,896千円			
立山町補助金 20,606千円			2,290千円 施設所有者 負担(10%)
国補助金 6,868千円 (町補助金額の1/3)	町負担額 13,738千円		
	うち特別交付税(80%) 10,990千円	実質町負担額 2,748千円	

※県に対し県単独補助金の創設について要望しています。


3 補助対象事業の内容

- (1) 補助対象となる山小屋 雷鳥荘
- (2) 事業内容（補強方法）
雷鳥荘4階屋根裏倉庫の床上にアラミド繊維を敷設する。
- (3) 施行スケジュール
 - 5月18日 国の補助金交付決定
 - 6月8日～ 補強工事着工
 - 7月12日 国の補助金変更申請（申請変更12,000千円 → 6,868千円）
 - 7月18日 国の補助金変更承認
 - ～7月25日 補強工事完了




○「雷鳥荘」補強のイメージ


A棟・B棟断面図

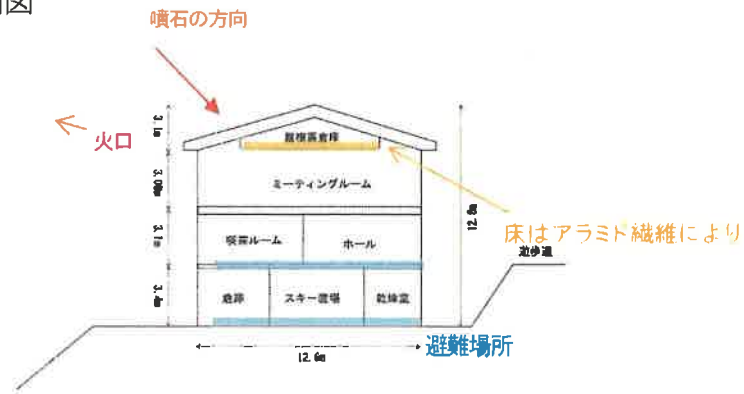


1階平面図

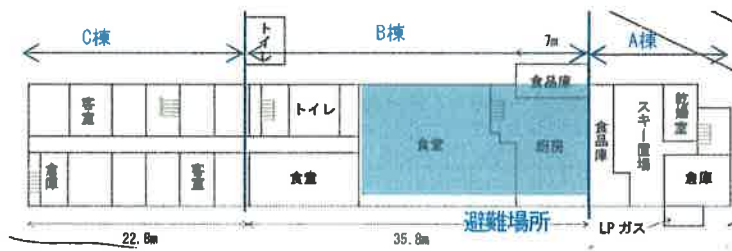


2階平面図



3階平面図



4階平面図



材料検査写真



工事施工写真



